


REQUERENTE: Município de Arcos de Valdevez

OBRA: Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

PLANO DE TRABALHOS

ID	Artigo	Nome da Tarefa	Un	Quant.	Duração(Dias Úteis)	Início da Tarefa	Conclusão da Tarefa	Rendimento (Un/Dia)	Predecessoras	Sucessoras	Tarefa Crítica
1		Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal			12 dias	02-05-17	17-05-17				Sim
2		Auto de Consignação / Aprovação do PSS				02-05-17	02-05-17			5II;8II;9II;10II	Sim
3	1	ESTALEIRO, PSS E PGRCD			0	12 dias	02-05-17	17-05-17	0		Sim
4	1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos	VG	1	12 dias	02-05-17	17-05-17	0,08	2	14	Sim
5	1.2	Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra.	VG	1	12 dias	02-05-17	17-05-17	0,08	2II	14	Sim
6	1.3	Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.	VG	1	12 dias	02-05-17	17-05-17	0,08	2II	14	Sim
7	2	DESMONTES/DEMOLIÇÕES			0	6 dias	02-05-17	09-05-17	0		Sim
8	2.1	Demolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo ceramico, incluindo remoção de portas de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em betão revestidas a cerâmico e demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos pro	VG	1	6 dias	02-05-17	09-05-17	0,17	2II	12;13	Sim
9	2.2	Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	VG	1	6 dias	02-05-17	09-05-17	0,17	2II	12;13	Sim
10	2.3	Demolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários.	VG	1	6 dias	02-05-17	09-05-17	0,17	2II	12;13	Sim
11	3	DIVERSOS			0	6 dias	10-05-17	17-05-17	0		Sim
12	3.1	Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimento do vão, de acabamento identico às existentes, com 10 cm de largura, incluído todos os trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos em vidro.	VG	1	6 dias	10-05-17	17-05-17	0,17	8;9;10	13II;14	Sim
13	3.2	Execução de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluíndo pintura.	VG	1	6 dias	10-05-17	17-05-17	0,17	8;9;10;12II	14	Sim
14		Auto de Consignação / Aprovação do PSS				17-05-17	17-05-17		12;13;4;5;6		Sim

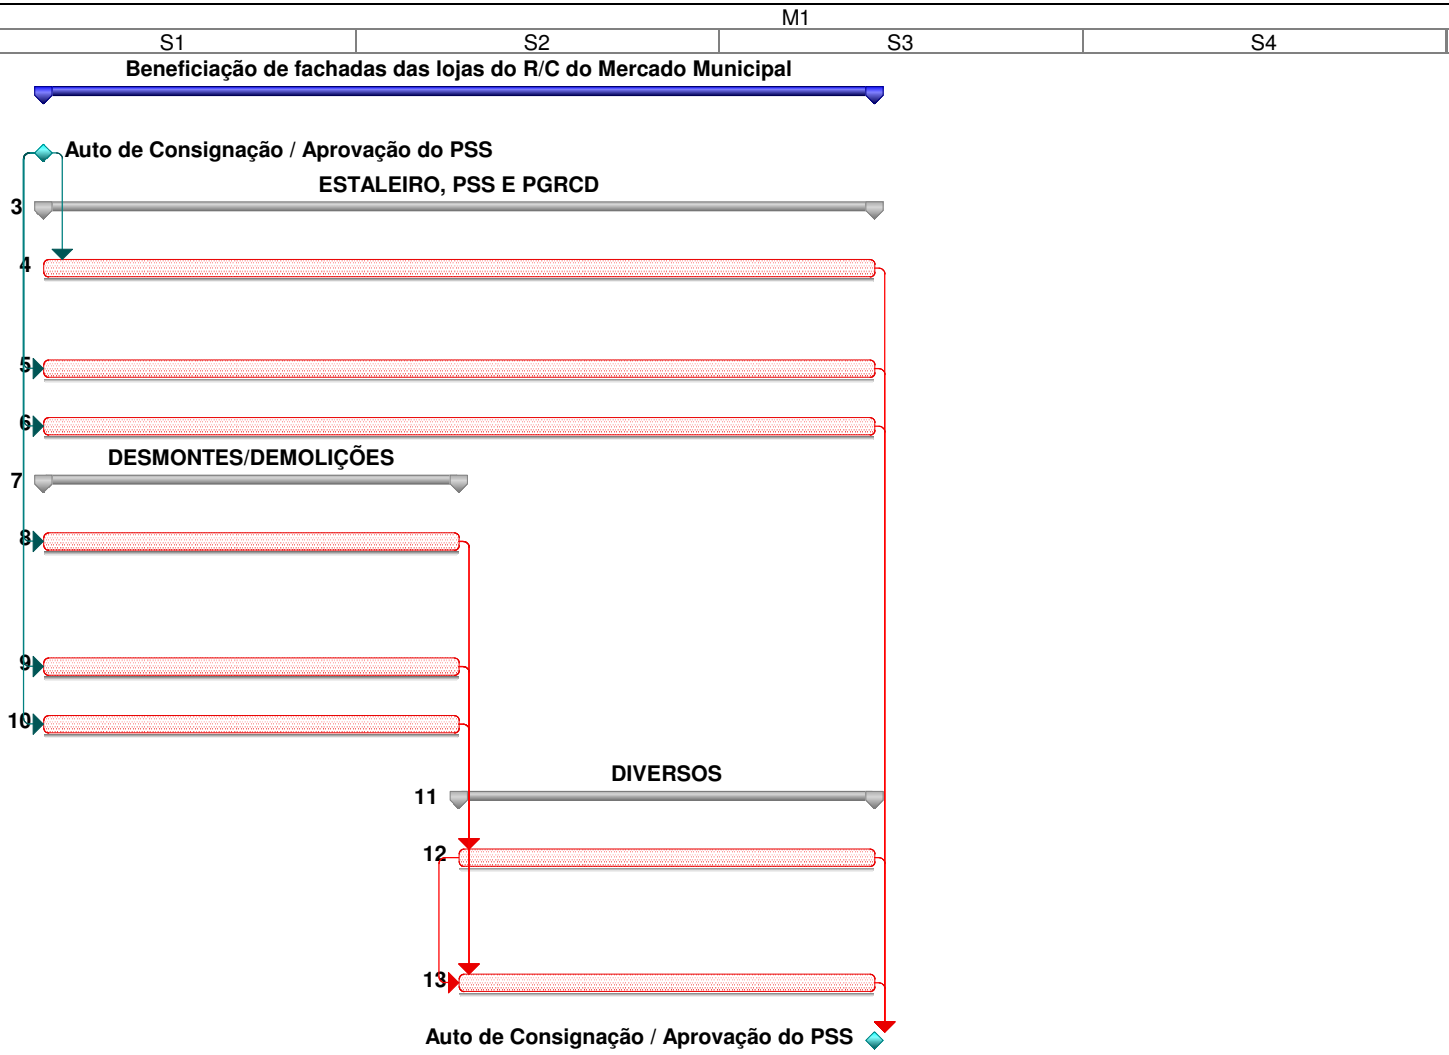

LEGENDA

- Tarefa

Tarefa Crítica
- 
- Marco

Sumário
- 
- Tarefa Agregada

Tarefa Crítica Agregada
- 
- Marco Agregado

Progresso Agregado
- 
- Dividir

Tarefas Externas
- 
- Resumo de Projecto

Agrupar por Sumário
- 
- Progresso

Prazo
- 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 Dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP.
