Signed By: NAROM, S.L. SUCURSAL EM PORTUGAL
Signing Date: 2015/08/27 08:42:25 GMT +01:00
Reason: Aprovo o documento

SUCURSAL EM PORTUGAL
narom@mail.telepac.pt

Plano de Equipamentos

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos
0	**Bloco XLVIII - Acesso a Parral - Cabreiro**	**120 dias**	**Ter 01-09-15**	**Ter 29-12-15**		
1						
2	**0. Estaleiro, PSS e PGRCD**	**120 dias**	**Ter 01-09-15**	**Ter 29-12-15**		
3	0.1. Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15		
4	0.2. Implementação do PSS	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15		
5	0.3. Implementação do PGRCD	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15		
6	0.4. Telas finais	3 dias	Ter 01-09-15	Qui 03-09-15		Software
7						
8	**1. Caminho**	**100 dias**	**Ter 01-09-15**	**Qua 09-12-15**		
9	**1.1. Demolições e terraplanagens**	**58 dias**	**Ter 01-09-15**	**Qua 28-10-15**		
10	1.1.1. Alargamento e regularização da plataforma	27 dias	Ter 01-09-15	Dom 27-09-15		Retroescavadora;Camião
11	1.1.2. Regularização de taludes	20 dias	Seg 28-09-15	Sáb 17-10-15	10	Retroescavadora
12	1.1.3. Levantamento pavimentos existentes	11 dias	Dom 18-10-15	Qua 28-10-15	11	Escavadora giratória;Camião
13	**1.2. Muros e vedações**	**96 dias**	**Ter 01-09-15**	**Sáb 05-12-15**		
14	1.2.1. Escavação	8 dias	Qui 29-10-15	Qui 05-11-15	12	Escavadora giratória
15	1.2.2. Betão ciclópico de fundações	10 dias	Sex 06-11-15	Dom 15-11-15	14	Auto-betoneira
16	1.2.3. Betão ciclópico em elevação de muros	10 dias	Seg 16-11-15	Qua 25-11-15	15	Auto-betoneira
17	1.2.4. Muros de alvenaria de pedra	10 dias	Qui 26-11-15	Sáb 05-12-15	16	Ferramentas diversas
18	1.2.5. Vedação com prumos	8 dias	Ter 01-09-15	Ter 08-09-15		Ferramentas diversas
19	1.2.6. Vedação com guarda metálica	8 dias	Qua 09-09-15	Qua 16-09-15	18	Ferramentas diversas
20	**1.3. Pavimentação**	**66 dias**	**Seg 28-09-15**	**Qua 02-12-15**		
21	1.3.1. Abertura e regularização da caixa	30 dias	Seg 28-09-15	Ter 27-10-15	10	Retroescavadora
22	1.3.2. Camada de tout-venant	7 dias	Qua 28-10-15	Ter 03-11-15	21	Espalhadora de inertes;Cisterna d
23	1.3.3. Rega de colagem	1 dia	Sex 20-11-15	Sex 20-11-15	25	Cisterna de rega asfáltica
24	1.3.4. Betão betuminoso de desgaste	1 dia	Sex 20-11-15	Sex 20-11-15	25	Espalhadora betuminoso;Cilindro
25	1.3.5. Bermas em lajeta de betão	16 dias	Qua 04-11-15	Qui 19-11-15	22	Auto-betoneira;Ferramentas diver
26	1.3.6. Assentamento calçada à portuguesa	12 dias	Sáb 21-11-15	Qua 02-12-15	24	Ferramentas diversas
27	**1.4. Sinalização**	**1 dia**	**Sáb 21-11-15**	**Sáb 21-11-15**		
28	1.4.1. Sinal de trânsito STOP	1 dia	Sáb 21-11-15	Sáb 21-11-15	24	Ferramentas diversas
29	**1.5. Diversos**	**53 dias**	**Dom 18-10-15**	**Qua 09-12-15**		
30	1.5.1. Reconstrução de ramadas	16 dias	Sex 30-10-15	Sáb 14-11-15	31	Ferramentas diversas
31	1.5.2. Remoção de ramadas	12 dias	Dom 18-10-15	Qui 29-10-15	11	Ferramentas diversas;Bobcat
32	1.5.3. Levantamento e reposição de tubos em polietileno	12 dias	Qui 29-10-15	Seg 09-11-15	12	Escavadora giratória;Bobcat
33	1.5.4. Adaptação de portões	5 dias	Sáb 21-11-15	Qua 25-11-15	24	Ferramentas diversas
34	1.5.5. Adaptação de acesso, degraus e vedação	5 dias	Qui 26-11-15	Seg 30-11-15	33	Ferramentas diversas
35	1.5.6. Construção de acesso ao terreno	2 dias	Ter 01-12-15	Qua 02-12-15	34	Ferramentas diversas
36	1.5.7. Demolição e construção de fontenário	7 dias	Qui 03-12-15	Qua 09-12-15	35	Ferramentas diversas
37	**1.6. Rede de drenagem de águas pluviais**	**21 dias**	**Qui 29-10-15**	**Qua 18-11-15**		
38	1.6.1. Valetas em lajeta de betão armado	15 dias	Qua 04-11-15	Qua 18-11-15	22	Auto-betoneira;Ferramentas diver
39	1.6.2. Assentamento em tubos de PP	8 dias	Qui 29-10-15	Qui 05-11-15	12	Escavadora giratória;Ferramentas
40	1.6.3. Bocas em valeta	5 dias	Dom 08-11-15	Qui 12-11-15	39;42	Ferramentas diversas
41	1.6.4. Bocas em talude	5 dias	Sex 13-11-15	Ter 17-11-15	40	Ferramentas diversas
42	1.6.5. Assentamento de tubos de betão	10 dias	Qui 29-10-15	Sáb 07-11-15	12	Escavadora giratória;Ferramentas

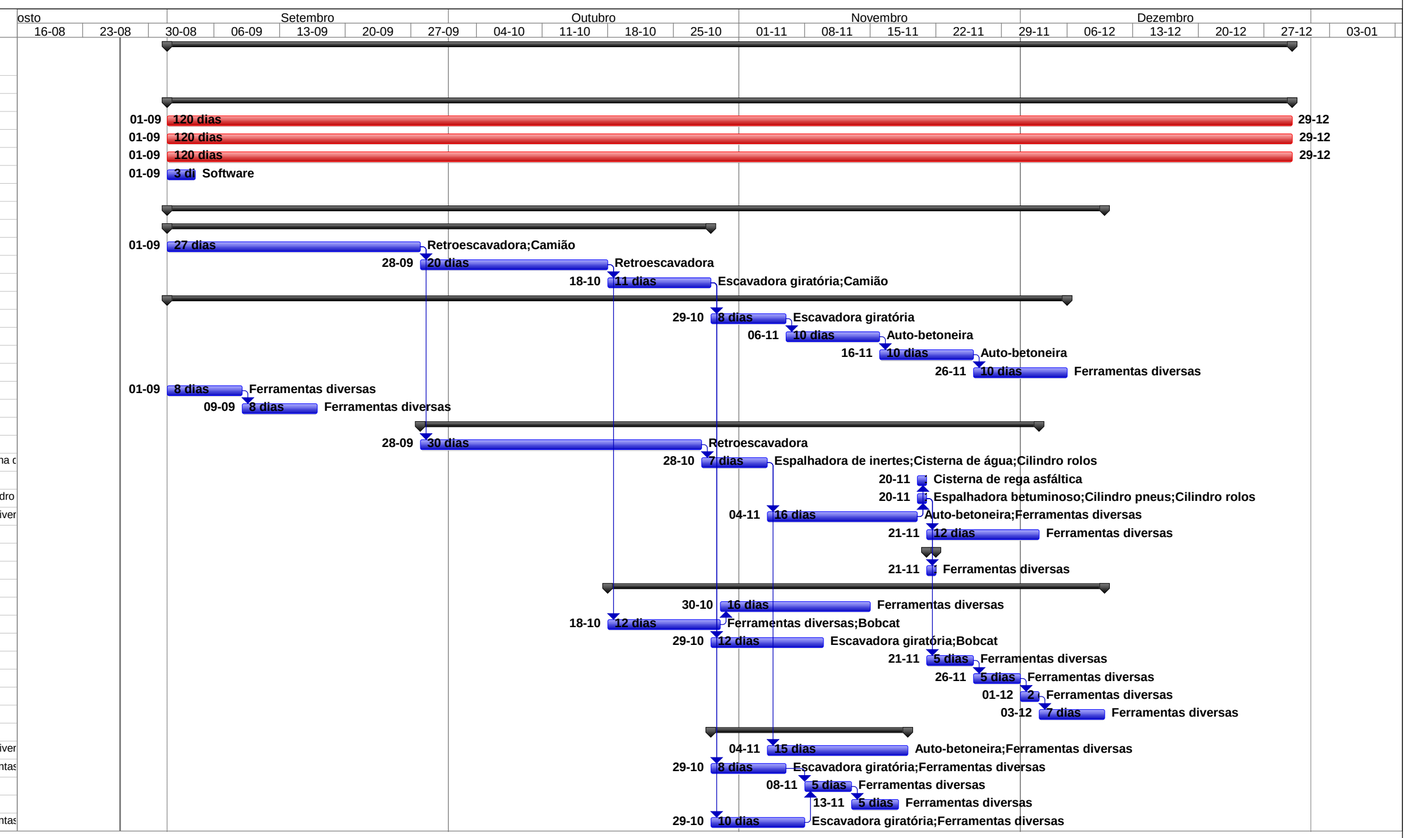

Projeto: Bloco XLVIII - Acesso a Parral - Cabreiro
Data: Qui 27-08-15

Tarefa | Tarefa crítica | Resumo
