Capta Formas, Lda.
Lugar de Tufe, 4980 - 663 Ruivos - Ponte da Barca
Contribuinte n.º 508 285 356
Alvará n.º 64881

RECONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO
NA RUA ESPÍRITO SANTO / RUA CARLOS CUNHA (VALETA) -
TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA

ID	Art.	Nome da Tarefa	Duração	Predecessoras	Crítica	Início	Conclusão
1	**1**	**CAP. I - ESTALEIRO**	**60 dias**		**Sim**	**01-04-15**	**30-05-15**
2	**1.1**	**ESTALEIR**	**60 dias**		**Sim**	**01-04-15**	**30-05-15**
3	21120	Instalação, montagem e desmontagem de um estaleiro com	60 dias		Sim	01-04-15	30-05-15
4	**2**	**CAP. II - DEMOLIÇÕES**	**15 dias**		**Sim**	**06-04-15**	**20-04-15**
5	4224	Exterior	12 dias	6II+3 dias	Sim	09-04-15	20-04-15
6	5280	Interior	15 dias	3II+5 dias	Sim	06-04-15	20-04-15
7	**3**	**CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS**	**10 dias**		**Sim**	**21-04-15**	**30-04-15**
8	3520	Movimento de Terra	10 dias	5	Sim	21-04-15	30-04-15
9	**4**	**CAP. IV - ESTABILIDADE**	**32 dias**		**Sim**	**29-04-15**	**30-05-15**
10	704	Trabalhos Preparatório	2 dias	8CC	Sim	29-04-15	30-04-15
11	10560	Betão Armado	30 dias	10	Sim	01-05-15	30-05-15
12	5280	Fornecimento de material e execução de paredes de suporte em alvenaria de pedra, com	15 dias	10II+12 dias	Sim	11-05-15	25-05-15

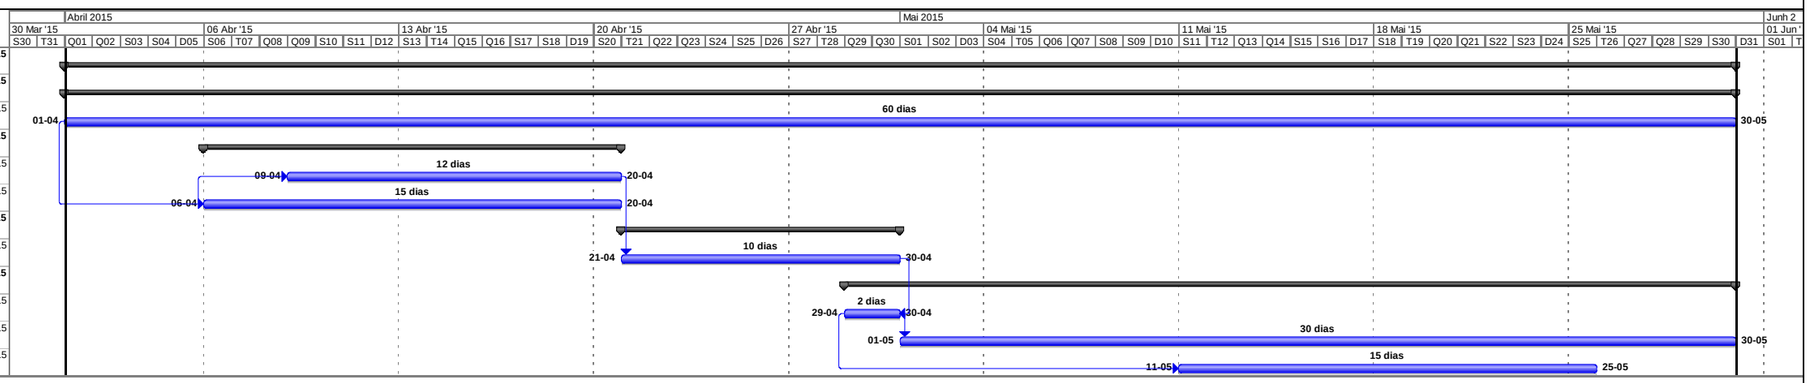

PLANO DE TRABALHOS
18-03-2015

Tarefa | Dividir | Progresso | Marco | Sumário | Resumo de Projecto | Tarefas Externas | Marco Externo | Prazo

Prazo de Execução: 60 DIAS

Documento assinado digitalmente por:
CAPTA FORMAS, LDA
Data: 2015.03.18 14:28:28
Motivo: Assinatura documentos proposta Ajuste direto
Local: Ruivos
